




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๑๑๙

ที่ สส.๕๐๒๑/๒๖๑๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ดำเนินการจ้างก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิศรัชนาพิตร” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมโภตฯ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมเด็จพระปรมินทรมหาดิรกฯ ทรงเป็นประธานในพิธี ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ตามที่สำนักปลัดฯ แจ้งให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจ้างก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิศรัชนาพิตร” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมโภตฯ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมเด็จพระปรมินทรมหาดิรกฯ ทรงเป็นประธานในพิธี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

จำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายจากบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิศรัชนาพิตร” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมโภตฯ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมเด็จพระปรมินทรมหาดิรกฯ ทรงเป็นประธานในพิธี ๒๕๖๘ ๙๘ ประจำปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ บริษัท มาโขม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเจษฎา ณูณประภาศิริ)

นายกอธิการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล/แขวง แม่กลอง อำเภอ/เขต เมือง สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๘๘๔๐๐๐๕๔๔๗ โดย นายเจษฎา ภูมิประภาศิริ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มาโฮม จำกัด มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๙๐/๗๘ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง ละหาร อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี โดยนายอรรถพล สุภาพ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๒๒๐๑๖๑๔๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานก่อสร้างมณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิศมราชาบพิตร" เนื่องในโอกาสพระราชสมมติคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนนี บรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรี พุทธศักราช ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงครามกำหนด จำนวน ๑ แห่ง ฯลฯ

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้งาน จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ สำเนาใบเสนอราคา

จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ สำเนาบันทึกต่อรองราคา

จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ สำเนาแบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก),

จำนวน ๖ หน้า

แบบ ปร.๕ ฯลฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา ภูมิประภาศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล สุภาพ)



๒.๔ สำเนาแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน ๔ หน้า

๒.๕ สำเนาแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

จำนวน ๙ หน้า

๒.๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ

จำนวน ๑๙ หน้า

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจังหวัดที่ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจังหวัดทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เล่มที่ ๒๕๖ เลขที่ ๐๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕% (ร้อยละห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา manifold ให้แก่ผู้ว่าจังหวัดเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากร่วมที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาเหลือเชื่อมต่อ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจังหวัดใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัด

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจังหวัดจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจังหวัดคงจ่าย และผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๔๗๙.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐาน เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นว�다 ๗ ดังนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา ภูมิประภาศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล สุกษา Home Co.,Ltd.)



งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างมณฑลปลูก "พระคริมหาโพธิ์ศรมราชบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคล
พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระปูทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาริราชแห่งราชวงศ์จักรี
พุทธศักราช ๒๕๖๘ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยเริ่มดำเนินงานจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๕๕ วัน)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากลาง
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า
ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจ
แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับ
ออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หัก
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ
ทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ที่ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา ญาณประภาศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....
(นายอรุคพล สุภาพ) Mahome Co., Ltd.



๕.๖ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๙) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้ประเทศไทย มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีเดลินิวอุ่นใจทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา ภูมิประภาศรี)

(ลงชื่อ).....
(นายอรรถพล สุภาร)



โดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวทั้งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา


ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจังแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า “นั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน


ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา ณูณประภาศิริ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล สุภาพ)



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ความเสียหายได้ ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพระเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างตั้งกล่าวไว้ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาว่าต่อถูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมเรื่องความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วยจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๒๐ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำการให้ผู้รับจ้างพัฒนา รับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๒๑ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา ญาณประภาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....
(นายอรรถพล สุภาร)



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๘.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....-) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุ ต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา ณูณประภาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....
(นายอรรถพล สุภาพ)
Mahome Co., Ltd.



ในการณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงจอดรถหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในการณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา ญาณประภาศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายอรุณพล สุภาร)

Mahome Co., Ltd.



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบให้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา ภูมิประภาคริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)..........

(นายอรรถพล สุภาพ)



บันทึกต่อรองราคา

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ บริษัท มาโนม จำกัด

ได้เสนอราคา งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ให้กับผู้เสนอราคาที่ สำมิงค์พาร์ค หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จำนวน 498,000.- บาท (- สี่แสนบาทถ้วน)

เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคากับ บริษัท มาโนม จำกัด

เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนอราคา ข้อตกลงมาใหม่

โดยขอเสนอราคาร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (- สี่แสนบาทถ้วน) กำหนดส่งของภายใน วัน กำหนดยืนยันราคาวัน

วัน กำหนดลงมือทำงานภายในระยะเวลา 45 วัน ผู้ดูแลรักษาบ้านให้ดูแลรักษา

พร้อมนี้ จึงให้ผู้เสนอราคากลางลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เอกสารนี้มีผลบังคับใช้ของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(นายธนกร คงไทย) Dhanakorn Co., Ltd.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอรุณรัตน์ ลูกน้ำใจ) Arunrat Lukanai

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเจษฎา บุญมาประภารติ)

นายกุลย์กุล บุญมาประภารติ

ลงชื่อ.....
นายจุรุดพล ลูกน้ำใจ
Mandarin Co., Ltd.

ลงชื่อ..... พนักงาน

(นางสาวชัยณุญา แสงสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ลงชื่อ..... พนักงาน

(นายศรีระวุฒิ สุคนธชัยวงศ์)

(.....))

ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ข้าพเจ้า นพดิษฐ์ หงษ์อ่อน สำนักงาน

สำนักงานใหญ่ดังอยู่เลขที่ ๙๐/๗๘ ถนน

ตำบล/แขวง คลองท่าศาลา อําเภอ/เขต นางสาวกานต์ จังหวัด ห้วยท่าชัย

โดย นพดิษฐ์ หงษ์อ่อน พากเพียร



สำนักงานใหญ่ ห้วยท่าชัย จังหวัด ห้วยท่าชัย

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการเสนอราคา และเอกสารเพิ่มเติม (ด้านี) เลขที่ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง นพดิษฐ์ หงษ์อ่อน พากเพียร

. ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารเสนอราคา ตามราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๙๖,๐๐๐ บาท (- สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน.๔๙๖,๐๐๐.-)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคนี้เป็นระยะเวลา วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามอาจรับคำเสนออนี้ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารเสนอราคาที่แนบท้ายทั้งหมดที่มีของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคนี้ที่พ่วงรับรองไว้ใน ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ.

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารเสนอราคายืดอันที่สำนักงานอัยการ
สูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใน วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือ^{ให้ไปทำสัญญา}

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารการเสนอราคา
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากำ
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคากลับ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาจดำเนินการเสนอราคากลับก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออนี้
หรือใบเสนอราคากลับใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบด้วยตนเองว่าเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลุมเชือด

๘. ในใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธนิรุ่งเรือง และประจักษากลั่นอุบล หรือการสนับสนุนคัดกั๊ฟประกัน
โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นใบเสนอราคากลับ ทางทักษิณรังสิต
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ พากเพียร

(นพดิษฐ์ หงษ์อ่อน พากเพียร)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(นายอรรถพล สุภาน)

Mahome Co. Ltd.

Mahome Co. Ltd.

(นางสาวชญญาบุน พงสวัสดิ์)

ที่วุฒิมาตราจัดหาสุด

ลงชื่อ พagan
(นายศรีราษฎร์ สุคนธ์ชัยร)

แบบสรุปราคาคลังงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : มูลค่าลับลูก "พระศรีมหาโพธิ์ศมราชนพิตร" ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ : อบจ.สส. 014/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคาคลัง เมื่อวันที่ : 10 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

: ตามคำสั่งงบประมาณบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 105/2568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	มูลค่าลับลูก "พระศรีมหาโพธิ์ศมราชนพิตร" ฯลฯ	499,177.98	
			เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่...../๒๕๖๘ ลงวันที่.....เดือน.....๑๐ ปี.....๒๕๖๘ พ.ศ.....
สูป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,177.98	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	499,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเขาวรัช หัคนกิจโภุ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการ
(นายเจอก กานต์ประภาศรี)ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนรรตณ์ ทองนิมิต)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการ
(นายมัช กองทอง)
ผู้อำนวยการ
(นายมัช กองทอง)
Mahome Co.,Ltd.ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวชัญญาณ แสงสว่าง)

ท้วหนานฝ่ายจัดทำแพสตู

ลงชื่อ..... พยาน

(นายศิริราช ศุภนธงชัย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : มนต์คลปัญญา "พระคริมท่าโภธิ์ศูนย์ราชบัพพิตร" ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลคลองประดู่ อำเภออัมพawa จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ : อ.บจ.สส. 014/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 3 หน้า

คำนวนราคาคงเหลือวันที่ : 10 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคาคงเหลือ

: ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 105/2568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าใช้จ่ายต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	180,053.80	1.3091	235,708.43	
2	งานสถาปัตยกรรม	196,291.57	1.3091	256,965.29	
3	งานระบบสุขาภิบาล	4,968.50	1.3091	6,504.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			ยกเว้นเมื่อเป็นราคาระบบเดียวเท่านั้นของสังกัด	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			ลงวันที่..... เดือน เดือน
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง					499,177.98

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเชาว์วุฒิ พูลวิจิตร์)

ผู้อำนวยการในตำแหน่ง

ลงชื่อ... ผู้อำนวยการในตำแหน่งผู้ว่าราชการ
(นายเจษฎา อกลีประภากิจิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวารีย์รัตน์ ทองนิมิต) ลงชื่อ..... อรุณพร..... ผู้รับผิดชอบ นายมนัส กองทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน (นายธีระศักดิ์ สุวรรณ) Mahoma Co., Ltd ผู้รับผิดชอบวิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวชัยญาณุช แสงสว่าง)
ทั้วหน้าฝ่ายจัดทำพหลุลงชื่อ..... พยาน
(นายศรีรุ่งอรุณ ศุภนรีชชวร)

รายการ ปริมาณงาน เลี้ยงราคาน้ำ

ແມ່ນ ປັດຈຸບັນທີ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนลากู "พระคริมทางพิเศษนราฯบันทิร" ฯลฯ

ສະພາບທີ່ກອງຮຽນ : ພົມໄຟ ຕະຫລາດປະເທດ ວິທະຍາວົມພາວ ຈິ້ງເກີດສຸມທຽບສົງຄຣານ

ฯฯ เกี่ยวกับ “โรคระบาด” ที่ควบคุมต้องห้าม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมควรลงความ

จำนวนผู้ร่วมความลับโดย : บุษบกธรรมการกำหนดรากลง

ບົນກາເລື່ອງທີ່ : ຖະຈຸກສັດ: 014/2560

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

גָּמְן

รายงาน บริมาณงาน และราคา

แบบ ประดิษฐ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : มูลนิธิ “พระศรีมหาพิริมหาราชบพตร” ฯลฯ
ที่อยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อ.ป่าสัก จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคางross คำนวณการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
แบบที่ : บงกช 014/2568

หน่วย :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคร่าวๆ		ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน			
2 งานสถาปัตยกรรม								
2.1 งานตกแต่งผิวน้ำ		ลังบัวตี้	ลังบัวตี้	๑๐๔.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑๐๔.๐๐	๓๒,๐๒๑.๖๑	
- พื้น ครส.ล. ก่อสร้างคราดล้าง เบอร์ 4 โภสเพลา		87.680	ตร.ม.	261.21	22,902.89	104.00	9,118.72	32,021.61
- เศษร่อง ก้าง 1 ซม.		13.800	ตร.ม.	-	-	45.00	621.00	621.00
- พื้น คล.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวกันหินหยาบ ขนาด 4x4 นิ้ว		11.750	ตร.ม.	1,010.77	11,876.55	159.00	1,868.25	13,744.80
- พื้นกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวกันหินหยาบ ขนาด 3-5 ซม.		0.300	ตร.ม.	1,250.00	375.00	375.00	112.50	487.50
- ปลูกหญ้าวนล้อม		50.00	ตร.ม.	797.50	-	-	797.50	
- ดินร่วนปูทาง สำหรับปูดินปืน		789.00	ลบ.ม.	15,054.12	-	-	15,054.12	
2.2 งานตกแต่งผิวน้ำ								
- ผังพื้นผิวการก่อสร้าง เบอร์ 4 โภสเพลา	ลังบัวตี้	๑๐๐.๓๕๒.๙๐	ลังบัวตี้	๒๖๒.๔๙	9,769.88	128.00	4,764.16	14,534.04
- ผังปูนปูน		2.30	ตร.ม.	๕๗๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๓๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐
- ขอบปูนปูนปืน หนา 2.๕ ซม. ทาสีขาว		160.00	ตร.ม.	๓๖๘.๐๐	๖๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๕๐๖.๐๐	
- งานปูปูนซีเมนต์ พระศรีมหาโพธิ์ศูนย์รวมพิพิธภัณฑ์ หินแกรนิตสีเขียว		100.00	ตร.ม.	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๔๐๐.๐๐
กัดกร่อนลอกสีห้อง พื้นห้องติดตั้ง (ตามแบบ)		๑.๐๐	ตร.ม.	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๙๐๐.๐๐
- งานปูปูนซีเมนต์ สำเนาเลือดตัดด้วยหิน หินแกรนิตสีเขียว		1.00	ตร.ม.	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐.๐๐
- งานปูปูนซีเมนต์ พระศรีมหาโพธิ์หินทรายขาวหินขาว หินแกรนิตสีขาว		1.00	ตร.ม.	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๙๐๐.๐๐
กัดกร่อนลอกสีห้อง พื้นห้องเสนา (ตามแบบ)		1.00	ตร.ม.	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๙๐๐.๐๐
รวมงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							196,291.57	

รายงาน ปริมาณงาน เคลื่อนตัว

แบบ บร.4 แผ่นที่

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง : มูลค่าปลูก "พาร์คซีรีส์พาโนเรียล์" ฯลฯ

สถาบันที่ก่อสร้าง : พื้นที่ 2 ทำด้วยตัวเอง จำนวนบ้านพัก จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคาคงทิ้ง : คณิตธรรมนากาภิมหาคราภากา


แบบเลขที่ : อบจ.สส. 014/2568

เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน้า : 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ		ค่านแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคាខองกว้าง	จำนวนเงิน	ราคาก่อหนาย	จำนวนเงิน		
3 งานระบบสุขาภิบาล									
3.1 งานระบบห้องน้ำดินและลิ้นประปาของบ้านพักน้ำ	ลิ้นวันที่.....เต็อน ๑๔๕ เมตร ๒๖๘๗๔.๙๓๐๐								
- ห้อง SUB-DRAIN ขนาด Ø 3"	6.00	เมตร	131.66	789.96	75.00	450.00	1,239.96		
- ท่อ PVC - 8.5 ขนาด Dia. 4"	1.00	รำ	315.00	315.00	90.00	90.00	405.00		
- ท่อ OVER FLOW - ห้อง PVC - 8.5 ขนาด Dia. 3" เจาะรูรุน	6.00	เมตร	136.68	820.08	100.00	600.00	1,420.08		
- ห้องเชื้อมา ใหม่ผล - ห้อง PVC - 8.5 ขนาด Dia. 3" เจาะรูรุน	4.00	เมตร	84.34	337.36	75.00	300.00	637.36		
- ตอมแกรนหลักห้องน้ำ ขนาด Dia. 3"	2.00	อุด	186.91	373.82	50.00	100.00	473.82		
- ตอมแกรนหลักห้องน้ำ ขนาด Dia. 4"	2.00	อุด	233.64	467.28	50.00	100.00	567.28		
- ตาข่ายมุ้งลวดด้านล่อ	4.50	ตร.ม.	40.00	160.00	10.00	45.00	225.00		
รวมงานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน ลิ้นวันที่.....เต็อน ๑๔๕ เมตร ๒๖๘๗๔.๙๓๐๐									
(๑๔๕๒๖๘๗๔.๙๓๐๐)									

(๑๔๕๒๖๘๗๔.๙๓๐๐) จังหวัดสุพรรณบุรี
นายกฤษณะ ก่อสร้าง บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



[Signature]
ผู้ดูแล
รายงาน

(นายกฤษณะ แมสังค์วันวุฒิ)
ผู้ดูแล

หัวหน้าฝ่ายจัดหา

[Signature]
ผู้ดูแล
รายงาน
(นายกฤษณะ แมสังค์วันวุฒิ)
ผู้ดูแล

การแบ่งงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคลปุก "พระศรีมหาโพธิศรุมราษฎรพิตร" ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานก่อสร้าง ถนนคลปุก "พระศรีมหาโพธิศรุมราษฎรพิตร" จำนวน 1 แห่ง เสร็จทั้งหมดตามรูปแบบและรายการ

เสร็จทั้งหมดตามรูปแบบและรายการ

- งานอื่นๆ ที่เหลือพร้อมทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยของงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน นับตั้งจากวันทำสัญญา

คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่างาน

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔

ลงวันที่ เดือน ๑๘ ปี ๒๕๖๔ พ.ศ.

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง
(นายเจนภา ภูมิประภาศิริ)
นางสาวยุทธนา ภูมิประภาศิริ
นางสาวอรุณรัตน์ สุวรรณ
นายนาฏิศา ภูมิประภาศิริ

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง
(นายอรุณรัตน์ สุวรรณ)
Mahomie Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
พยาน
(นางสาวขันญานุช แสงสว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำเพสด

ลงชื่อ.....
พยาน
(นายศิริราษฎร์ ศกนธ์ชัย)
ศกนธ์ชัย

แบบที่จังหวัดประชุมฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

กิตติมศักดิ์

หนังสือรับรอง
สำหรับห้องเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพดีเยี่ยม
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

๑๘๔

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับอนุญาต
ชื่อ..... พล.ท.พญ. พัชราภา พูนพันธ์


ผู้รับอนุญาต
ชื่อ..... พญ.อรอนงค์ คงมาลัย

สถานที่..... ๑๙๐ ถนนเพชรบุรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้รับอนุญาต
ชื่อ..... พญ.อรอนงค์ คงมาลัย


ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

สถานที่ที่ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ

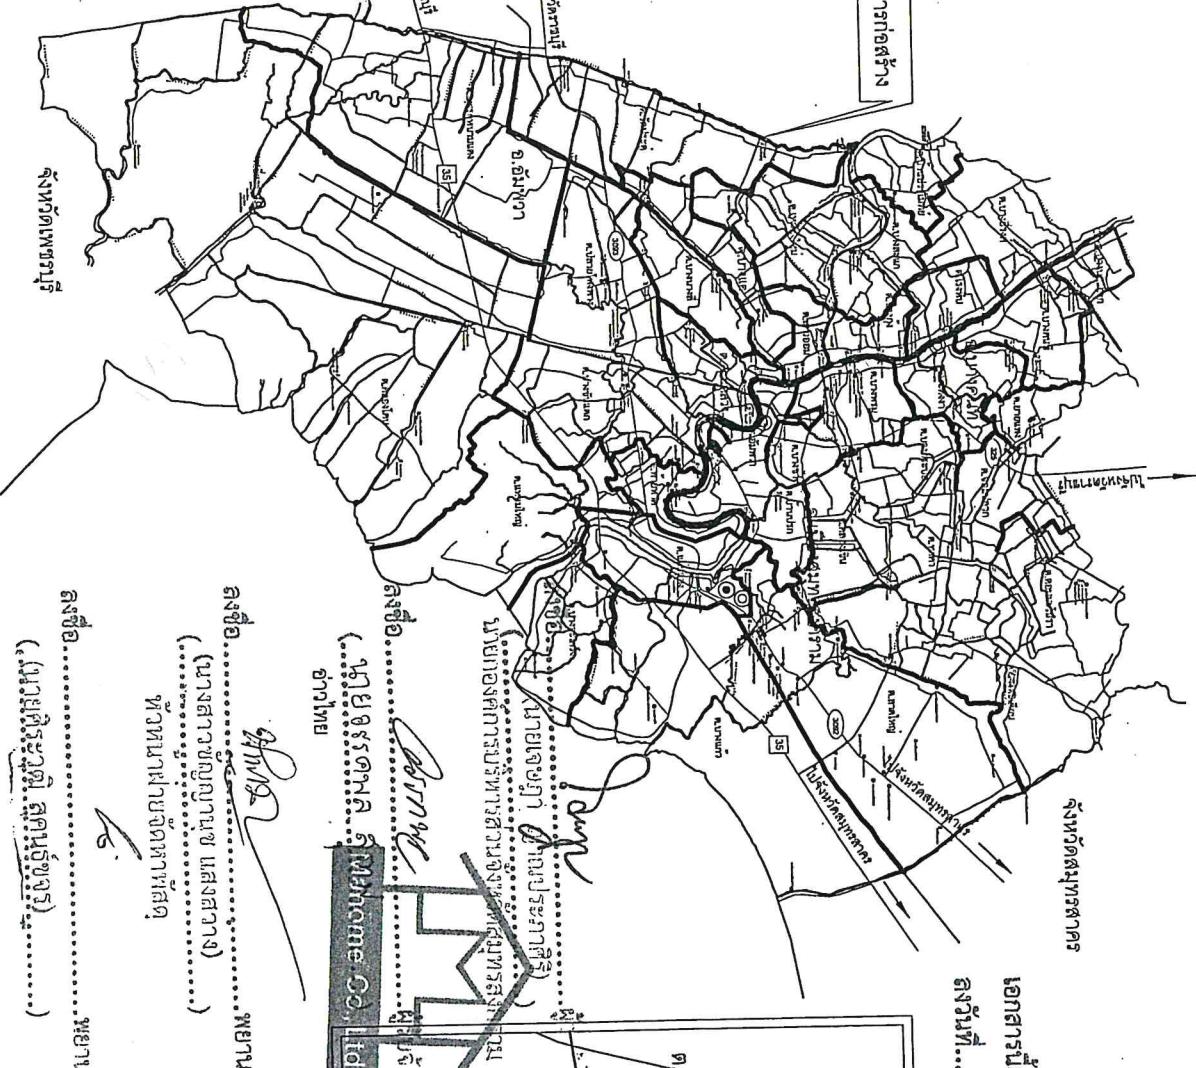

ลงชื่อ..... จ. บริษัทฯ
(นายปรีดา ลูกานรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทฯ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการ
(นายปรีดา ลูกานรุ่งเรือง)

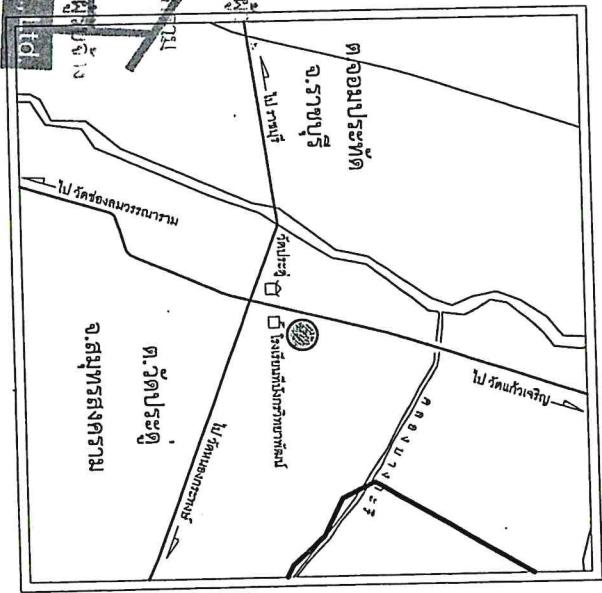

(นายปรีดา ลูกานรุ่งเรือง)	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทฯ
นามสกุล..... ลูกานรุ่งเรือง	ชื่อ..... ปรีดา
แผนก..... แผนก...	ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการบริหาร
หน้าที่..... ผู้อำนวยการบริหาร	ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

(นายปรีดา ลูกานรุ่งเรือง)	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทฯ
นามสกุล..... ลูกานรุ่งเรือง	ชื่อ..... ปรีดา
แผนก..... แผนก...	ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการบริหาร
หน้าที่..... ผู้อำนวยการบริหาร	ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

กิตติมศักดิ์


สำเนา ๑ / ๑๘๔

แบบร่างแปลงป้ายสีสาธารณะ




ผู้ดูแลรักษาและดูแลอาคาร
ก่อสร้างฯ



จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย



ขนาดห้องน้ำชาย 300
ลิตร ใช้เวลาไม่เกิน 300



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ ฉบับที่ ๒๙/๑๗๕๙
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

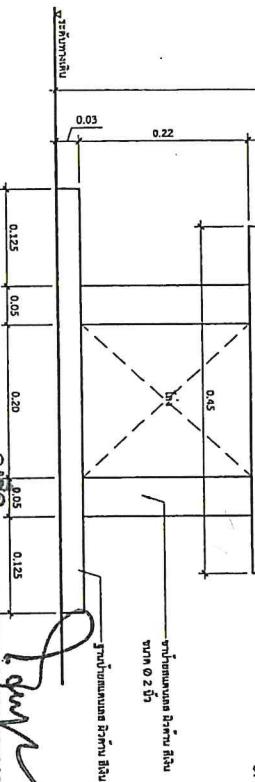

(เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร)

นางสาวอรอนงค์ พานิชย์

(เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร)

นางสาวอรอนงค์ พานิชย์

(เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร)

นายกรุงษิริ คงมาศ

(นายกรุงษิริ คงมาศ)

นายกรุงษิริ คงมาศ

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

บ้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่

สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ມະນາລປ່າລັກ “ພຣະສິຮົມທາໂພດີທສມຈາຊພືພຕູ”

(ປຶງປີປະມາດ 2568)

ກອງມີເບດົກາຮັກການແຄລະຜົນສົມອອງ

ເອກະການນີ້ປັບປຸງ ແລ້ວຍືນຍົງທີ່ ໄກສະຫຼຸງ / ໂກງໍາ
ລົງວັນທີ ຕີຂອນ ປີ ໨ ມີຍີ ເຖິງວິສ. ພ.ສ.

ລົງຈູ້..... (ມະຍາໄລຫຼັກ ດູກປະຫຼັກ ກົກ) ສູງວິຫຼາສ

ນະພາບອະນຸຍາກຕະກຳບັນດາລົງຈູ້ ຜົມມະນຸຍາ

ລົງຈູ້..... ສູງວິຫຼາສ
(ນະພາບອະນຸຍາກຕະກຳບັນດາລົງຈູ້ ສູງວິຫຼາສ
Mahome Co., Ltd)

ມະນາລປ່າລັກ “ພຣະສິຮົມທາໂພດີທສມຈາຊພືພຕູ”
ອົບໂຄງການ



ກອງທະຈອງມະນຸຍາ ໄກສະຫຼຸງ
ສານທັກສອງ

ກອມໃຍດົກາຮັກແລະສົມນູອງ ກອງທະຈວນນຸ່ມ ໄກສະຫຼຸງ
ອະນຸຍາກຕະກຳບັນດາລົງຈູ້ ຈົນວານ

ລົງຈູ້..... (ມະນຸຍາຫຼັກ ສົມນູອງ ແລ້ວຍືນ)
ພະຍານ
(ມະນຸຍາຫຼັກ ສົມນູອງ ແລ້ວຍືນ)
ທີ່ວ່ານຸ່ມເນັດຫຼາຍ


ລົງຈູ້.....
(ມະນຸຍາຫຼັກ ສົມນູອງ)

ພະຍານ

ຈົນວານ

รายการสิ่งที่ได้รับ

รายการสิ่งที่ได้รับ	จำนวน
ลักษณะที่ดิน	ตามที่แนบมา
ทางเดิน	โดยทั่วไป ทางเดินที่กว้าง 0.30 เมตร ทางเดินในเขตอาคารต้องกว้าง 0.60 เมตร
อุปกรณ์	ไม่มี

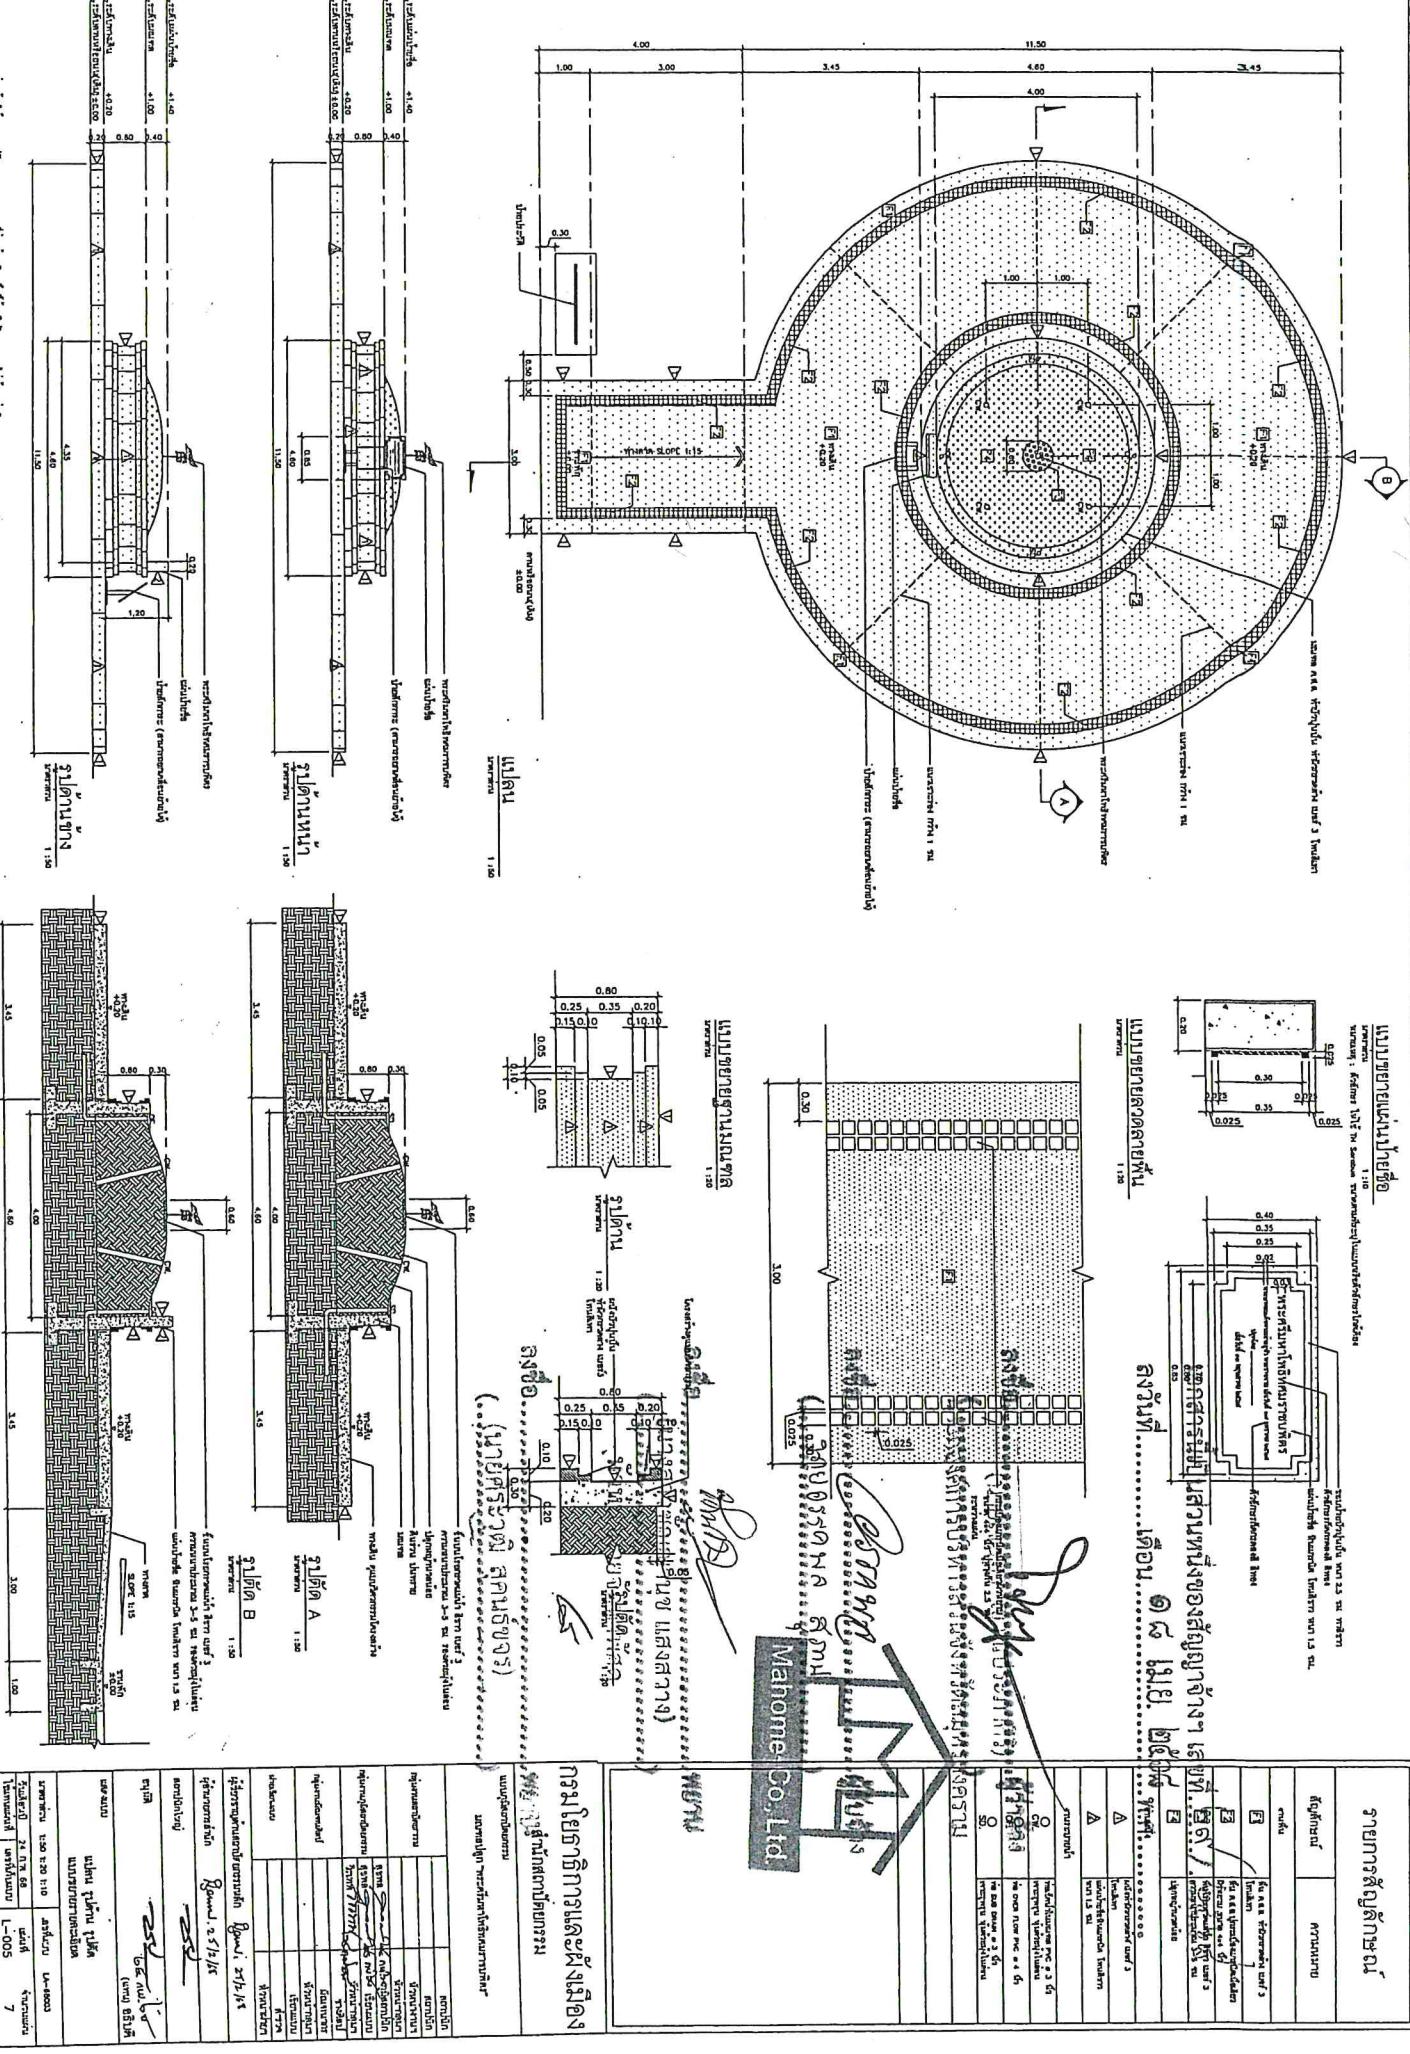

รายงานการสัญญาณ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่... ๑๒๓๔
ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗




แบบอย่างร่างสัญญา

ฉบับที่


ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับ


ผู้ให้

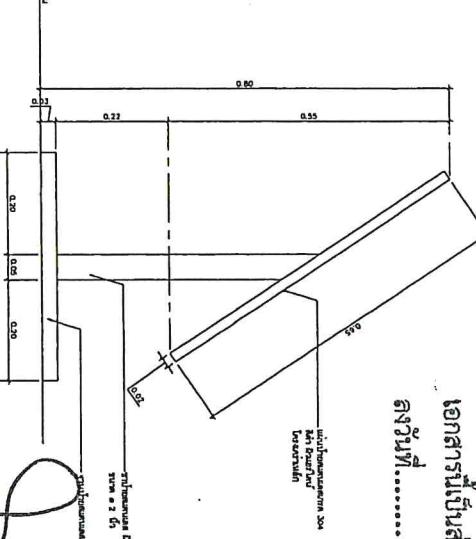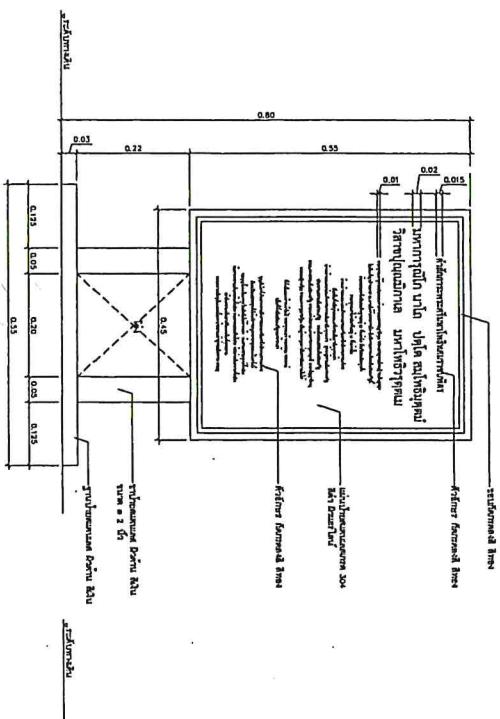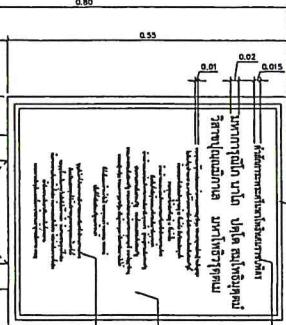

รูปแบบหน้า

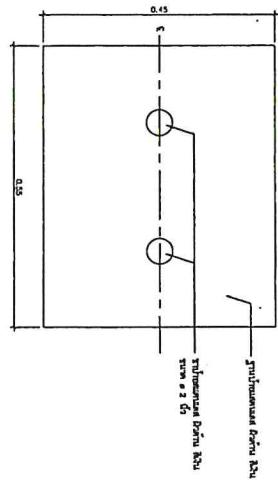

รูปแบบข้าง

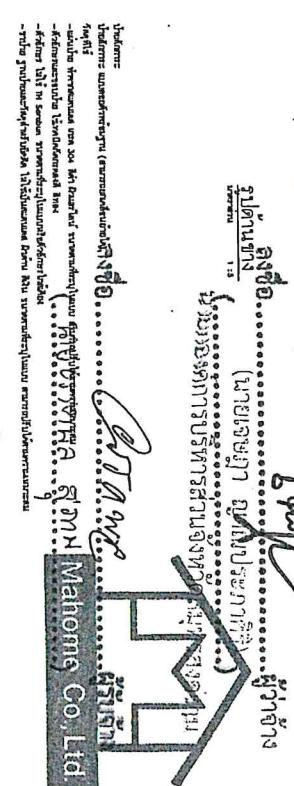

ภูมิฯ ยินยอมว่า รายการและจำนวนที่ตั้งไว้ในสัญญาฯ ทุกประการ เป็นไปตามที่ตกลงไว้

ผู้รับ

ภูมิฯ ยินยอมว่า รายการและจำนวนที่ตั้งไว้ในสัญญาฯ ทุกประการ เป็นไปตามที่ตกลงไว้

ผู้ให้

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(บันทึกไว้แล้ว)

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(บันทึกไว้แล้ว)

(บันทึกไว้แล้ว)

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับ

ภูมิฯ ยินยอมว่า รายการและจำนวนที่ตั้งไว้ในสัญญาฯ ทุกประการ เป็นไปตามที่ตกลงไว้

ผู้ให้

รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
ห้องนอน	๑	ห้อง	
ห้องน้ำ	๑	ห้อง	

រាយការក្រឹងតុលាងណ៍

ក្រុងកំណែ

ការបានបាប

សារពាណិជ្ជកម្មប្រចាំខែ

ទីតាំង នគរាមេណ ភ្នំពេញ

ខេត្ត

ក្រុងកំណែ




ផែកតារដែលបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩
តួនាទី តួនាទី ៣៧ និង ៣៨
តួនាទី តួនាទី ៣៩ និង ៤០

ផែកតារដែលបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩
តួនាទី តួនាទី ៣៧ និង ៣៨
តួនាទី តួនាទី ៣៩ និង ៤០

លក្ខណៈ និង នូវការ

លក្ខណៈ និង នូវការ



ក្រុងកំណែការងារទូទៅដែលបានបង្កើតឡើង

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩

នាយកដ្ឋាន និង នូវការ

(នាយកដ្ឋាន និង នូវការ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

ឯកសារការងារទូទៅដែលបានបង្កើតឡើង

នាយកដ្ឋាន និង នូវការ


ការងារ	លក្ខណៈ	នូវការ
ការងារ	ខ្លួន	ខ្លួន
ការងារ	ខ្លួន	ខ្លួន
ការងារ	ខ្លួន	ខ្លួន

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่.../๒๕๖๑
ลงวันที่.....เดือน...๑๙... ปี...๒๕๖๑ พ.ศ....

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

สูตรการปรับราคา

(แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นر 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532)

ลงชื่อ.....
(นางเจนทร์ ภูมิประภาศรี)
ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการซื้อขายสิ่งของ

ลงชื่อ.....
(นายอรรถกุล มากนพิล Co., Ltd.)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวชลธรญา แสงสว่าง)
พยาน
(.....)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำห้องคัด

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ ศุคนธ์ชัย)
พยาน
(.....)

(สำเนา)

ที่ นบ 0203/ก 109

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ

ทำเนียบเบื้องหน้าต กทม. 10

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาข้อหาเดือนผู้ประกอบชาชีพงานก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๕/๒๕๑๙

ลงวันที่เดือน ก.ย. ๒๕๑๙ พ.ศ.

ผู้ร้องเรียน หนึ่งสิบสำเนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ ที่ นบ 0203/ก 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สั่งให้ลงมาด้วย สำเนาหนึ่งสิบสำเนากับประชามติ ที่ กพช 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นฟ้องติดคดียังนี้ ดังนี้ กรณีพิจารณาข้อหาเดือนผู้ประกอบชาชีพ

ก่อสร้างมาเพื่อสืบปฏิบัติต่อไป นั้น

บันทึก คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างให้เสนอให้
หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง อนุมัติ และวิธีการดำเนินงานที่ใช้กับตัญญานแบบปรับราคาไว้
6 ชั้น มาเพื่อคดียังนี้ ดังนี้ ความละเมิดประยุคปัจจุบันล้วนๆ ความละเมิดประยุคปัจจุบันที่

คดียังนี้ได้ประชุมปีก่อนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติ
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ห้อง 6 ชั้น ให้ตัด “ก่อนหนึ่งวัน” ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามที่หมายกำหนดให้ตัด
ล้วนห้องนึง หน่วยงานนี้ที่ไม่กฎหมายบัญญัติให้มีรากฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ส่วนราชการที่อื่น
หน่วยงานอื่นของรัฐต้องปฏิบัติต่อไป

ลงวันที่ผู้ร้องเรียน
(นายเจษฎา อุดมประภาน)

นายกองการบริหารส่วนท้องที่บ้านหนองคาน

จังหวัดเชียงใหม่ แต่ในวันนี้ ทางราชการได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ไม่กฎหมายบัญญัติให้มีรากฐานเป็นมาตรฐาน
มาตรฐานเดียวกันที่ส่วนราชการท้องถิ่น แต่ทางราชการที่น่องรัฐต้องปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความเสียใจในสิ่งที่กล่าวไป..... พยาน
(นายสุรเชษฐ์ บุญฤทธิ์).....
หัวหน้าฝ่ายจัดทำผลด

อพันธ์ อนันต์กฤษ..... พยาน
(นายศรีรัตน์ ลักษณ์จันทร์).....
(นายไนน์ พันธ์อนันต์กฤษ).....

(สำเนา)

ที่ กพส 7/2532

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาข่าวyleoผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการตุรี

ข้อถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการตุรี ที่ นรา 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

ผู้ที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น

2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖๙/๒๕๓๒
ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการตุรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม
หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในกรณีพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ของทางราชการ

2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร

3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณารายจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิถีด้วยการณ์และ
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอบรอดมติพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณานำแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเมื่อวันที่
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการใช้สัญญาแบบปรับราคานี้ได้มีมติเสนอคณะกรรมการตุรี
และเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคามาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเหมาที่ได้รับความเสียหาย
จากการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
เดือน.....
(นาย..... ผู้รับเหมา)
..... จำกัด จำกัด
..... Mahomed Co. Ltd.

ลงชื่อ.....
(นางสาว..... แสงสว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำที่สุด

ลงชื่อ.....
(นายศิริราช ศรีราช)

เดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคาน้ำดื่มเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างนำราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุให้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประนาทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อขยายผลให้ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการดังนี้

1. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประนาทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารแนบท้าย ๑๘ ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.)

2. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประนาทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารแนบท้าย ๑๙)

3. งานจ้างเหมา ก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือน่วยงานอื่นของรัฐ ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประนาทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่ส่วนนักบุญกับประมาณพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินขาดเพิ่ม จนทำให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจัดการด้วย ให้ก่อหนี้ยกพันกันก่อนกว่าบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้อธิบายการพิจารณาอนุมัติจ่ายของสำนักงบประมาณ ลักษณะที่สัมภูติ ผู้รับจ้าง (นายเจษฎา ภูริพัฒน์) ผู้รับจ้าง (นายภูลังค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) ผู้รับจ้าง (นายอรรถาธร ศรีบุญ home Co., Ltd.)

ลงชื่อ..... พ.ย. พ.ศ. พ.ย. พ.ย.
(นางสาวชุมนยา พลังสวัสดิ์)
ทัวหน้าฝ่ายจัดทำทั้งสี่
ลงชื่อ..... พ.ย. พ.ศ. พ.ย. พ.ย. พ.ย.
(นายศิริราษฎร์ ศักน์ชัยร.)

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงบประมาณทำการวินิจฉัย
ปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตัดสินใจต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงศ์ สารสิน

(นายพงศ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔
ลงวันที่ เดือน ๑๘ ปี ๒๕๖๔ พ.ศ.

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

ลงชื่อ.....
(นายเจนภา ณูณประภากิริ)
นายนายอธิการบดีห้องส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงชื่อ.....
(นายอรรถมนต์ สุกานะ Home Co. Ltd.)

ลงชื่อ.....
(นางสาวชัลนาณ แสงสุราษฎร์)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำห้องดู

ลงชื่อ.....
(นายศิริรุฒิ ศุภนร์ชุร)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง ดูครุและวิธีการดำเนินงานที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างที่นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับแก้ซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมงานก่อสร้างในลักษณะเหมาค่าครุภัณฑ์ ที่ติดตามด้วยที่ดินและที่ดินที่ไม่ติดตาม บนอุดมสมบูรณ์และหมายความว่าจะจ่ายอัตราเดียวกันที่เพิ่มขึ้นในสัญญาและค่าที่คืนและที่ดินที่ก่อสร้าง หรืออยู่ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙๗/๒๕๖๘
๑๖ เมย. ๖๔๖๘ พ.ศ.
ลงวันที่เดือน..... พ.ศ.

2. สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างที่นี้ให้ใช้ทั้งในการซื้อหินหรือหินร่องรอยก่อสร้างจากผู้ขาย เมื่อต้นน้ำราคายังคงที่เดิมโดยกระบวนการทางพาณิชย์ นิการแปลงสภาพสูงขึ้นหรือลดลงเดิม ขณะเดียวกันน้ำที่ต้องปรับเปลี่ยนราคาก่อสร้าง สำหรับกรณีที่ซื้อหินโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันนี้เป็นวันนี้ แต่ถ้า.....(นายเจษฎา ลูกบุญธรรม) ผู้ว่าจ้าง
นิการแปลงสภาพหินหินร่องรอยก่อสร้างจากผู้ขาย ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างนี้มาใช้กับงานที่ต้องแบ่งแยกประเภทให้สูงกว่าเดิม เช่น ในประการก่อสร้างตัวอาคาร และต้องระบุไปยังผู้ซื้อหินหินร่องรอยก่อสร้าง ให้สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างที่นี้ พึงอ่านให้ฟังก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
(นางสาวชัยลักษณ์ แสงสอาด)

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานนี้ทั้งหมดที่ซื้อหินหินร่องรอยก่อสร้าง จึงต้องแยกเป็นงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ นั้นจะให้ต่อค่าดูครุภัณฑ์ก่อสร้างที่ก่อสร้างไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับเหมาได้ตั้งหน่วยงานของดูครุภัณฑ์ที่นั้นก่อสร้างไปแล้ว ผู้รับเหมาไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างหากผู้รับเหมานี้ได้ออกและไม่ได้รับเงินเดือน ให้ผู้รับเหมาที่เป็นผู้สัญญาเข้ารับเรียกจากผู้รับเหมาได้เช่นเดียวกัน หรือให้หักเงินจากหักประทับได้ตามที่ได้รับเงินเดือน

5. กรณีการยกเว้นเงินเพิ่มหรือลดค่า แต่การจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับเหมาตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบและเห็นชอบ

(2)

- 2 -

ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพื่อปรับต่อราคาก่อสร้างทั้งหมดที่มีกำหนดตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

จำนวนที่	P	=	ราคาก่อสร้างค่าห์น่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงที่จะต้องชำระ ให้ผู้รับซื้อ <small>เอกสารนี้เป็นล่วงหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่.....เดือน๑๙ ๘๕ ๒๕๖๗ พ.ศ.</small>
	Po	=	ราคาก่อสร้างค่าห์น่วยที่ผู้รับซื้อจะประบูตให้ หรือราคาก่อสร้าง เป็นวงที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับแต่ละฉบับ
	K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักตัว 4% เมื่อคิดongบริษัทที่ก่อสร้าง หรือมากเพิ่ม 4% เมื่อคิดongบริษัทที่ก่อสร้าง <i>นายเจษฎา บุญยะกาชาด</i> ลงวันที่.....๑๙๘๕ ๒๕๖๗ พ.ศ. ผู้จัดทำแบบฟอร์มที่ชี้แจงความเข้าใจของลูกค้าและผู้รับเหมา

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะของงาน

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร นายดึง ตัวอักษร เช่น ที่ทำการ *นายดึง โรงพยาบาล ๘๔* ที่หักตัว 4% หักประชุม หักเชินทร์ ชินแก้วซึ่ง ตารางที่หนึ่งเป็นต้นที่หักตัว 4% หักหัวหน้าผู้จัดทำที่หัวหน้าผู้จัดทำที่หัวหน้าผู้จัดทำ

1.1 ไม่ท้าขอรายการบรรจุในแบบฟอร์มที่ชี้แจงความเข้าใจของลูกค้าและผู้รับเหมา

1.2 ประปางของอาคารบรรจุตั้งท่อแม่น้ำห้วย แต่ไม่รวมที่ระบบประปา
ภายในบ้าน

1.3 ระบบห่อหรือระบบสายด้าว ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น
ห่อปืนอาคาร ห่อไฟฟ้าสายไฟฟ้าต่ำแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารที่ทางระบายน้ำจากบ้านนำเข้าบ้าน

1.5 ส่วนประกอบที่ใช้เป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โถงห้อง
ครัวพื้นที่ประกอบพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่

3.2 งานพิริยากร SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ St/So}$$

3.3 งานพิริยากร ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ St/So}$$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้างเลขที่...../.....
ลงวันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.

3.4 งานพิริยานกอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พิริยานกอนกรีตที่ใช้เหล็กซึ่งประกอบด้วยเหล็ก筋 (WELDED ST WIRE FARRIC) เหล็กคีอย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความถึงผู้ที่กอนกรีตเสริมเหล็กแบบริบาร์ (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ลงวันที่.....
(นายเจษฎา ภานุประภาครุ)
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Cv/Cd} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(นายอรรถพล สกุล Mahome Co., Ltd.)

3.5 งานท่อระบายน้ำกอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อบาño หมายถึง ท่อ กอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำน้ำท่าทางน้ำที่กอนกรีตเสริมเหล็ก งานดัดกอนกรีตเสริมเหล็กหักกระเบนหัวท่อ รวมทั้งงานบ่อบาño ท่อที่ต้องการหักกระเบนหัวท่อ เช่น งานบ่อบาño (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Cv/Cd} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างกอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดินด้วย กอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากกอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C. BEARING PAD) ท่อเหล็กกอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หรือที่น้ำ โครงสร้างกอนกรีตเสริมเหล็กที่อ่อนกันคลื่นกอนกรีตเสริมเหล็ก ท่านที่ยกเว้นกอนกรีตเสริมเหล็ก ท่านที่ยกเว้นกอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องตัวรับน้ำที่ไม่ถูก

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง ที่พานเหล็กสำหรับคานเรินหัวม้า โครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายรายการน้ำดื่มหวานสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ งานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายเดียวกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงสร้างสัญญาณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและประทานไฟฟ้า

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 4 งานชุดประทาน เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ลงวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

4.1 งานอาคารชุดประทานไปร่วมน้ำหนักเหล็ก หมายถึง อาคาร ห้องน้ำ ก่อสร้าง ฯ ที่ก่อสร้างในแนวลาดลงที่ขึ้นบันไดหรือคลองระบายน้ำ เพื่อความสูงกระดับและปริมาณน้ำ ได้แก่ ห้องน้ำน้ำ น้ำตก ร่องน้ำ สะพานน้ำ ห้องดูด ไขฟอน และอาคารชุดประทานน้ำอื่น ๆ ที่ไม่มีน้ำธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่ เช่น ทางระบายน้ำอื่น หรืออาคารชุดประทานประกอบของข้อมูลน้ำอื่นใด (นายเจษฎา ลภวนะประภาศิริ) ผู้ว่าด้วยการบริหารหุ้นจังหวัดสมุทรสงคราม

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

4.2 งานอาคารชุดประทานรวมน้ำหนัก หมายถึง อาคารห้องน้ำร่องน้ำ ขนาดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวลาดลงที่ขึ้นบันไดหรือคลองระบายน้ำ เพื่อความสูงกระดับและปริมาณน้ำอื่นใด (นางสาวชัยลักษณ์ แสงสว่าง) ได้แก่ ห้องส้วมน้ำข้าว ห้องน้ำน้ำ ประดุจห้องน้ำ อาคารห้องน้ำ ห้องดูด ไขฟอน และอาคารชุดประทานน้ำอื่น ๆ ที่มีน้ำธรรมชาติน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่.....(นายศิริราษฎร์ ศักดิ์ชาร์) ทางระบายน้ำอื่น หรืออาคารชุดประทานประกอบของข้อมูลน้ำอื่นใด (นายศิริราษฎร์ ศักดิ์ชาร์)

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

4.3 งานบานระบายน TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำที่บันกรรังก์ว้านและโครงยคงรวนทึ่ง BULK HEAD GATE และงานห้องน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Ct/Co}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กทึบเส้นที่ใช้ในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออุปกรณ์ติดตั้ง ประกอบของของขื่อน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากงานเหล็กตัวถ่วงท่าน้ำนั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/Sg}$$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่.....๒๙/๒๕๖๑
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคลอกติดตั้ง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักตัวบันช่องเหล็กของกานแยกกันวัสดุต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำดิน อาการจะประทานประกอบของของขื่อน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากงานคอนกรีตติดตั้งตัวถ่วงท่าน้ำนั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$


4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะหรือบuries ฝังหักกรุขมาตรฐาน ในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินดินที่แผลหัก เพื่อตัดน้ำดื่มน้ำ และให้รากติดทนต่อตัวภูเขา รากรากติดต่อตัวภูเขา ดูดและดูดตัวต่อๆ โดยการอัดน้ำดื่มน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัตโนมัติน้ำดื่มน้ำ ค่าวัสดุน้ำดื่มน้ำ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้จ่ายรากรากติดต่อตัวภูเขาระบบความต้านทานของเชิงแบบที่ก่อสร้างพารามิเตอร์ดังที่กำหนด คือ ค่าตั้งต้นที่เปิดของประกายตรา

ลงวันที่.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเจริญ งามประภากุล.....)
นางสาวหงษ์การบริหารจัดการและอุตสาหกรรม

ลงวันที่.....ผู้รับจ้าง

(นายทรงดุมล มงคล Co.,Ltd.)


หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

(นางสาวชัยญาณุ แสงสว่าง.....)
หัวหน้าฝ่ายจัดหน้าสัด

5.1.1 ในการที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำท่อ AC และหีดอุปกรณ์ให้

ลงวันที่.....พยาน

(นางสาวชัยญาณุ แสงสว่าง.....)

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACt/ACo}$$

(นายศิรัชณ์ หุ่นรองจาร.....)

5.2 งานวางท่อเหล็กหนาปีบและห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับซื้อเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ไว้

ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับซื้อเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กหนาปีบและหีบอุปกรณ์และ
ให้รวมดึงงาน TRANSMISSION CONDUIT เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๗
ลงวันที่.....เดือน ๑๘ แมย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับซื้อเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
และหีบอุปกรณ์

ใช้สูตร K = $0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุปกรณ์ต่อเนื่องและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร K = $0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC ทึมท่อขอดอนกิริต

ใช้สูตร K = $0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVC$
ลงชื่อ.....
(นายเจษฎา ภูรบกุลประภากิริ) ผู้รับซื้อ

(นายกอธิการบริหารสถาบันช่างและสถาบันพัฒนาครรภ์)

ใช้สูตร K = $0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVC$
ลงชื่อ.....
(นายยงรด พค.) ผู้รับซื้อ

(มหาชนก จำกัด Mahachon Co., Ltd.)

5.6 งานวางท่อเหล็กอ่อนสังกะสี

ลงชื่อ.....
(นางสาวชัยณานา แสงสาวยา) พยาน
ทั้วน้ำฝ่ายจดหมายสำคัญ

ประمهณงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานท่อหีบงานของก่อสร้างที่ไม่ใช่หีบดินเผาและหีบมีร่องหีบไทย
ทั้งนั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งน้ำและท่อและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานด้านดินและโครงสร้างทางเดินท่อและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

สำนักงานพัฒนาฯ โครงการสายส่งและอุปกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะ
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ตอกกิ่ว Boundary Post), TOWERS, INSULA
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUND
MATERIALS

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่.....๒๙/๒๕๖๑

ลงวันที่.....๑๘ เมย. ๒๕๖๑ พ.ศ.

สำนักงานพัฒนาฯ ได้ดำเนินการ หมายเหตุ เฉพาะการ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ได้ระบุ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

ลงวันที่.....(นายเจษฎา ชัยชนะ) ผู้ว่าฯ
(นายกิตติ์กานต์ บริษัทมหาดไทย) ผู้อำนวยการ

5.8 งานหดอ่อนและคงทนเส้นกาวเคลือบกาวซีเมนต์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

ลงวันที่.....(นายอรรถเมธ มนตรี) ผู้รับจ้าง
(นายอรรถเมธ มนตรี) ผู้ให้บริการ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ลงวันที่.....(นายศิริรุณ ศักดิ์ชาร) ผู้รับจ้าง
(นายศิริรุณ ศักดิ์ชาร) ผู้ให้บริการ

ประเมินงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าที่วนอุปกรณ์ภาคใต้เท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน ๖๙ – ๑๑๕ KV.

5.9.1 ในกรอบที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

ดัชนีราคาที่ใช้กำหนดความสูตรที่ใช้บัญชีญญากับปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑
ลงวันที่.....เดือน ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ.

- K = ESCALATION FACTOR
- H = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Ct = ดัชนีราคายืนตัว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคายืนตัว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหตุกಡาชีมันต์) ในเดือนที่ส่งงาน
แต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหตุกಡาชีมันต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- St = ดัชนีราคาน้ำดื่ม ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาน้ำดื่ม ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Gt = ดัชนีราคาน้ำดื่มน้ำร้อนที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Go = ดัชนีราคาน้ำดื่มน้ำเย็นที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- At = ดัชนีราคาน้ำมันพืช ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาน้ำมันพืช ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Ei = ดัชนีราคาก๊อซเชอร์ก๊อฟ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาก๊อซเชอร์ก๊อฟ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- Pt = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน
- ACt = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคาก่อน



ลงวันที่.....
นายอุดรเดช สงวน

Mahome Co., Ltd.

PET = คํัชั้นราคาห่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในสีอ่อนที่ส่งจาก
แหล่งจ梧ด

PEO = คํัชั้นราคาห่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในสีอ่อนที่เปิดช่อง
ประการคราค เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่... ๒๕๙๘/๔๙๙๙
ลงวันที่.....เดือน ๑๙ ๘๔๖๔ พ.ศ.....

Wt = คํัชั้นราคาถุงไนฟิล์ม ในสีอ่อนที่ส่งจานแบบส่งออก

Wo = คํัชั้นราคาถุงไนฟิล์ม ในสีอ่อนที่เปิดรองประกอบราค

ลงวันที่.....เดือน ๑๙ ๘๔๖๔ พ.ศ.....

(นายเจยภา ชุมประภากิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาก็อต

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะในพื้นที่ ให้ใช้สูตรด้านล่างนี้
ก่อสร้างของโครงสร้างพลาสติก โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างห้องน้ำ ประตูห้องน้ำ รวมถึงห้องน้ำในตัวบ้าน ก่อสร้างด้วยหิน
เดียว กัน ซึ่งต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภท ให้ตัดลบตัวที่ก่อฟล๊อตห้องน้ำที่งานนั้น แล้ว
ต่อค่าก่อสร้างห้องน้ำที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เดือนกันยายน ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน ให้มีการปิดกัน และกำหนดให้เป็นเดือนกันยายน (มกราคม) ให้เป็นผลสำเร็จอยู่ แต่ถ้า
ยอดห้องน้ำไม่ถูกหักห้ามลดลงที่หนึ่ง百分ต์เพิ่มเติมที่นั้น

4. ให้พิจารณาเงินที่มีห้องครัวสำหรับห้องน้ำที่ผู้รับจ้างที่สัญญาตกละ
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในสีอ่อนที่ส่งมอบงานมีค่าไม่เท่ากัน
จากค่า K ในสีอ่อนเปิดของราษฎราก่อตัว 4% ขึ้นไป โดยนำผลหารที่กิน 4% มาคูณ
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแต่ละเดือน (โดยไม่เกิน 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำรายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่สัญญา ให้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่อไปนี้จะนำไปใช้ในการคำนวณที่
ให้ไว้ค่า K ของสีอ่อนสูตรที่เพดานชายคาสัญญา หรือค่า K ของสีอ่อนที่ส่งมอบงานจริง แล้ว
ค่า K ด้วยจะมีค่าที่น้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละเดือนให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างที่ได้แต่งตั้งจากความตกลง



ด่วนที่สุด

ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕๒/ว ๔๗๐

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๕๐

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๖๙/๖๕๖๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐ พ.ศ.

เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่อง การพิจารณาที่วายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยที่มาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า
“หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน
อัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” จึงคณะกรรมการนโยบายได้กำหนด
แบบสัญญาจำนวน ๑๔ สัญญา โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามนัยมาตรา ๙๓ แล้ว เนื่องจากในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีสัญญาที่ต้องกำหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และที่มิต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยที่แบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดเป็นแบบสัญญา
จ้างก่อสร้างที่มิได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ ดังนั้น กรณีการทำสัญญา
จ้างก่อสร้างที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องดำเนินการอย่างไร นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายในมาตรา ๒๙ (๑) ฯ
เห็นสมควรข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ

ผู้จัดการโครงการ
(นายยุทธกร สำนักงานฯ)
บริษัท แมกนั่นกรุ๊ป จำกัด
(Magnan Group Co., Ltd.)


๑๗๕๐
(นางสาวชัยญาณี แสงสาร)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำเพรสตัล
๑๗๕๐
(นายศรีระตน์ ศศานันท์)

๑๗๕๐
(นายศรีระตน์ ศศานันท์)

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๑๖๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า ก) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนรวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๗๙/๒๕๓๒
ลงวันที่ เดือน ๑๘ เมษายน พ.ศ.

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโภติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย


ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายเจษฎา ภูมิประภาคร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


ลงชื่อ รับบัง
(นายยุทธพล สุขุม)
Mahome Co. Ltd.


ลงชื่อ พยาน
(นางสาวชัยณุนา แสงสว่าง)
ท้าวนาฝ่ายจัดทำหักดู


ลงชื่อ พยาน
(นายศิริราษฎร์ ศุคนธ์ชัยว.)

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑, ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ ๑๐๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

- เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดของที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๒๙๙/๒๕๖๑
- เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่.....เดือน ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ.....
- ยังถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ยังถึง ๑ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ กับสัญญา่อสร้ง โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ ต่อไป โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดชนีราคាដิ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลง จากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประการราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคางาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวันเสนอราคาในแต่ละวิธีไว้ชัดเจน ตามหนังสือที่ยังถึง ๒ และ ๓ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงบประมาณขอเรียน ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีวันเปิดของที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้จัดซื้อ..... ผู้จัดจ้าง.....
(นายจยภร ภูมิประภาวงศ์)

รายงานผลการบริหารส่วนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เสนอราคากล่าวว่าด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี ลงชื่อ.....

ผู้จัดซื้อ..... ผู้จัดจ้าง.....
(นายอธรคุณ สกุล)

๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เสนอราคากล่าวว่าด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

ผู้จัดซื้อ..... ผู้จัดจ้าง.....
(นายอธรคุณ สกุล Co., Ltd.)

๓) วิธีสอบราคา กำหนดวันเปิดของ คือ วันที่เปิดของข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคา เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

ผู้จัดซื้อ..... ผู้จัดจ้าง.....
(นางสาวชัยญาณุช แสงสว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำสคด

ลงชื่อ..... ผู้จัดซื้อ..... ผู้จัดจ้าง.....
(นายศิริราช สกุลชัย)
(นายศิริราช สกุลชัย)

- ๒ -

๒. วิธีการคัดเลือก กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นของข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคา เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

๓. วิธีการเฉพาะเจาะจง กำหนดวันเปิดซอง คือ วันที่ยื่นของข้อเสนอราคากลางหรือวันที่ต่อรองราคา เป็นที่ยุติ แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๔
ลงวันที่เดือน ๑๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ร.บ.

(นายเดชา กิตติปกรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเจนฤทธิ์ ภูมิประภาดิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระศักดิ์ สุธรรมานะโยชน์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวชญานุช แสงสว่าง)
หัวหน้าฝ่ายจัดทำข้อตกลง

ลงชื่อ..... พยาน
(นายศิริราช ศุคนธิจาร)

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๒๐๑๔
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๐
